

Капітальний ремонт складських приміщень №11-16 Центрального Міжрегіонального управління державної міграційної служби у м.Києві та Київській області за адресою: вулиця Молодогвардійська, 28, літ Е, м. Київ.

2021 закрито актами №№1-11+

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-7

на Капітальний ремонт складських приміщень №11-16 АКТ №7 за адресою: вулиця Молодогвардійська, 28, літ Е, м. Київ.

Капітальний ремонт складських приміщень №11-16 Центрального Міжрегіонального управління державної міграційної служби у м.Києві та Київській області за адресою: вулиця Молодогвардійська, 28, літ Е, м. Київ.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 786,31511 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,42071 тис.люд.-год.
Кошторисна заробітна плата 159,87439 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений в поточних цінах станом на "11 травня" 2021 р.

№ п/п	Об'єкту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд.-год.		
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробіт-ної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
											заробіт-ної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. ПІДСИЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЙ ПІДСИЛЕННЯ ФУНДАМЕНТІВ											
1	РН1-2-1	Розробка ґрунту при підведенні, заміні або посиленні фундаментів внутрішніх стін в котловані глибиною до 1,5 м	100 м3	0,15	<u>44156,11</u> 39082,29	-	6623,42	5862,34	-	<u>692,5800</u> -	<u>103,89</u> -
2	РН2-3-3	Посилення конструкцій сталевими балками	1 т	1	<u>55424,93</u> 14241,90	<u>147,85</u> 30,65	55424,93	14241,9	<u>147,85</u> 30,65	<u>217,5000</u> 0,3752	<u>217,5</u> 0,38
3	РН2-3-1	Посилення фундаментів монолітними залізобетонними об'єктами	1 м3	3,6	<u>6376,20</u> 1898,92	<u>248,24</u> 90,68	22954,32	6836,11	<u>893,66</u> 326,45	<u>29,0000</u> 1,2708	<u>104,4</u> 4,57
4	РН11-50-1	Відбивання штукатурки зі стін	100м2	0,752	<u>3454,58</u> 3218,24	<u>236,34</u> 93,14	2597,84	2420,12	<u>177,72</u> 70,04	<u>60,9400</u> 1,3038	<u>45,83</u> 0,98
5	Е46-4-2	Підсилення цегляних стін сталевими об'єктами	т	1,8	<u>55216,35</u> 19681,46	<u>4705,75</u> 1223,52	99389,43	35426,63	<u>8470,35</u> 2202,34	<u>296,1400</u> 15,3799	<u>533,05</u> 27,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6 РНЗ-14-2	Посилення цегляних стін металевими тязками		1 т	1,9	<u>31780,10</u> 12891,96	<u>498,40</u> 155,28	60382,19	24494,72	<u>946,96</u> 295,03	<u>203,8900</u> 1,8720	<u>387,39</u> 3,56
7 ХБЗ-6-4	Ремонт та заповнення неактивних тріщин з розкриттям до 20 мм в бетонних та залізобетонних конструкціях із застосуванням матеріалів ТМ "Сегест", положення тріщин: горизонтальне		1 метр	15	<u>135,20</u> 16,87	-	2028	253,05	-	<u>0,2700</u>	<u>4,05</u>
8 ХБЗ-6-5	Ремонт та заповнення неактивних тріщин з розкриттям до 20 мм в бетонних та залізобетонних конструкціях із застосуванням матеріалів ТМ "Сегест", положення тріщин: вертикальне		1 метр	12	<u>489,93</u> 19,37	-	5879,16	232,44	-	<u>0,3100</u>	<u>3,72</u>
9 ЕІЗ-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021		100м2	0,672	<u>926,09</u> 346,17	<u>44,25</u> 4,67	622,33	232,63	<u>29,74</u> 3,14	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>3,21</u> 0,05
10 РН11-50-4	ПІДСИПЕННЯ КОЛОН		100м2	1,2	<u>3832,70</u> 3566,36	<u>236,34</u> 93,14	4599,24	4315,63	<u>283,61</u> 111,77	<u>68,1000</u> 1,3038	<u>81,72</u> 1,56
11 Е4Б-7-1	Відбивання шпакатурки по цеглі та бетону зі стовпів, колон та підластр, площа відбивання в одному місці більше 1 м2		Т	9,314	<u>7435,38</u> 4469,73	<u>2202,15</u> 655,64	69253,13	41631,07	<u>20510,83</u> 6106,63	<u>70,6900</u> 7,9693	<u>658,41</u> 74,23
12 С111-1814 варіант 1	Підсилення залізобетонних колон естакад стальними обоймами		Т	6,3924	<u>22531,48</u>	-	144030,23	-	-	-	-
13 С111-985	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої звичайної якості марки Ст6сп, штабовий, товщина 10-75 мм при ширині 100-200 мм		Т	2,6376	<u>25376,99</u>	-	66934,35	-	-	-	-
14 С111-1839	Швелери N16-24 із сталі марки 18сп		Т	0,284	<u>39581,27</u>	-	11241,08	-	-	-	-
15 ХБЗ-6-4	РЕМОНТ БЕТОННИХ БАЛОК ПЕРЕКРИТТЯ		1 метр	15	<u>135,20</u> 16,87	-	2028	253,05	-	<u>0,2700</u>	<u>4,05</u>
16 ХБЗ-6-5	Ремонт та заповнення неактивних тріщин з розкриттям до 20 мм в бетонних та залізобетонних конструкціях із застосуванням матеріалів ТМ "Сегест", положення тріщин: горизонтальне		1 метр	12	<u>489,93</u> 19,37	-	5879,16	232,44	-	<u>0,3100</u>	<u>3,72</u>
17 СУ1-1-7	Ремонт та заповнення неактивних тріщин з розкриттям до 20 мм в бетонних та залізобетонних конструкціях із застосуванням матеріалів ТМ "Сегест", положення тріщин: вертикальне		100 м	0,5	<u>345678,60</u> 3994,92	-	172839,3	1997,46	-	<u>55,9200</u>	<u>27,96</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					732706,11	138429,59	31460,72		2178,9
		Разом будівельні роботи, грн.					732706,11		9146,05		113,01
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					562815,8				
		всього заробітна плата, грн.					147575,64				
		Загальновиборничі витрати, грн.					50961,62				
		трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.					110,68				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					11232,11				
		Всього будівельні роботи, грн.					783667,73				

		Всього по розділу 1					783667,73				
		Розділ 2. Інші роботи									
18	РН20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	8,46	86,08	-	728,24	728,24	-	1,6300	13,79
19	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	8,46	86,08	-	1560,95	-	1560,95	-	-
					184,51	184,51	251,77	251,77	0,4110	-	3,48
		Разом прямі витрати по розділу 2				29,76	2289,19	728,24	1560,95	0,4110	13,79
		Разом будівельні роботи, грн.					2289,19		251,77		3,48
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					980,01				
		Загальновиборничі витрати, грн.					358,19				
		трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.					0,85				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					86,63				
		Всього будівельні роботи, грн.					2647,38				

		Всього по розділу 2					2647,38				
		Разом прямі витрати по кошторису					734995,3	139157,83	33021,67		2192,69
		Разом будівельні роботи, грн.					734995,3		9397,82		116,49
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					562815,8				
		всього заробітна плата, грн.					148555,65				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					51319,81 111,53 11318,74 786315,11				
		Всього по кошторису					786315,11				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2420,71				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					159874,39				

Склав

інженер-проектувальник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]


Воевідю В.В.

Перевірів

директор

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Рудницький О.С.

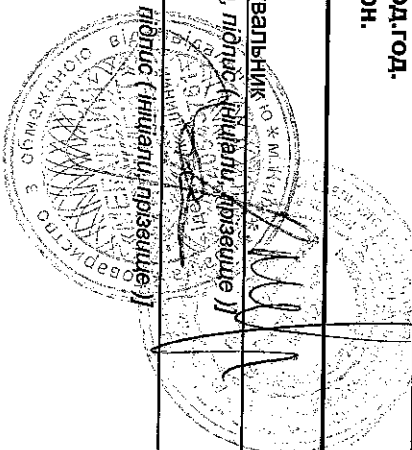

Капітальний ремонт складських приміщень №11-16 Центрального Міжрегіонального управління державної міграційної служби у м. Києві та Київській області за адресою: вулиця Молодогвардійська, 28, літ Е, м. Київ.
2021 закрито актами №№1-11+

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-8

на Капітальний ремонт складських приміщень №11-16 АКТ №8 за адресою: вулиця Молодогвардійська, 28, літ Е, м. Київ.

Капітальний ремонт складських приміщень №11-16 Центрального Міжрегіонального управління державної міграційної служби у м. Києві та Київській області за адресою: вулиця Молодогвардійська, 28, літ Е, м. Київ.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 613,30942 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 5,32215 тис.люд.-год.
Кошторисна заробітна плата 349,94729 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений в поточних цінах станом на "11 травня" 2021 р.

№ п/п	Об'єкту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
											заробіт- ної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Охоронно-тривожна сигналізація											
1 & 15096- 2011-10M	Матеріали, необхідні для монтажу Антен GSM Y-9 (SMA роз'єм, кабель 10м)	шт.	1	511,61	-	511,61	-	-	-	-	-
2 & 1602- 30035-78П	Прилад приймально-контрольний "ОРІОН NOVA L"	шт	1	3607,70	-	3607,7	-	-	-	-	-
3 & 1715- 10060-113H	M-Z модуль	шт	3	441,07	-	1323,21	-	-	-	-	-
4 & 1715- 10060-113B	Модуль розширення M-ZP box	шт	3	1942,57	-	5827,71	-	-	-	-	-
5 & 1715- 10060-189M	M-net + модуль	шт	1	636,57	-	636,57	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6 & 1602-30082-9	Виносна панель індикації "Р-ІND32"	шт	2	2364,07	-	4728,14	-	-	-	-	-
7 & 1602-30082-416	КІПАВІАТУРА К-LED 16	шт	3	918,07	-	2754,21	-	-	-	-	-
8 & 1602-30082-450	Клавіатура К-LED	шт	1	1699,57	-	1699,57	-	-	-	-	-
9 & 1602-30050-87	Датчик Swan Quad	шт	59	288,23	-	17005,57	-	-	-	-	-
10 & 1602-30050-340	Датчик Swan RGB	шт	32	703,03	-	22496,96	-	-	-	-	-
11 & 1602-30007-98	Сповіслювач СОМК 1-8 (МО 102-9-8) магнітоконтактний накладний на метал	шт	10	92,30	-	923	-	-	-	-	-
12 & 1914-9343-2	Кронштейн к СОМК-1-8	шт	16	26,31	-	420,96	-	-	-	-	-
13 & 1704-50724-43У	Оповіслювач УС-3 світлодіод	шт	1	31,24	-	31,24	-	-	-	-	-
14 & 1504-18081-9	ІРТС сповіслювач охоронний	шт	1	91,27	-	91,27	-	-	-	-	-
15 & 1704-50724-12Г	Оповіслювач пожежний світлозвуківий "Гном-1"	шт	2	507,04	-	1014,08	-	-	-	-	-
16 & 1504-13252-3Ж	Блок живлення "БЖ 1215"	шт	3	1530,54	-	4591,62	-	-	-	-	-
17 & 1504-13252-2Ж	Блок живлення "БЖ 1230"	шт	1	2460,84	-	2460,84	-	-	-	-	-
18 & 1511-3001-77В	Акум. батарея В-12-7АН типу AGM	шт	7	314,47	-	2201,29	-	-	-	-	-
19 & 1511-3001-18	Акум. батарея LP 12-18АН типу AGM	шт	1	979,57	-	979,57	-	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1						73305,12					
Разом будівельні роботи, грн.						73305,12					
в тому числі:						73305,12					
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.						73305,12					
Всього будівельні роботи, грн.						73305,12					
Всього по розділу 1						73305,12					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 2. Витратні матеріали, необхідні для монтажу											
20 & 15096-2011-15M	Витратні матеріали, необхідні для монтажу ВВГ 3х1,5 Кабель	M	50	18,83	-	-	941,5	-	-	-	-
21 & 15096-2011-16H	Кабель КСВВнг-LS 8х0,4	M	550	6,63	-	-	3646,5	-	-	-	-
22 & 15096-2011-17H	Кабель КСВВнг-LS 10х0,4	M	700	9,43	-	-	6601	-	-	-	-
23 & 15096-2011-69	Кабель ФТР САТ-5Е 4х2х0,5 Cu LDPE зовнішній	M	200	11,23	-	-	2246	-	-	-	-
24 & 2405-1210-2010	Кабельний канал 20х10 (140) 220тм (3925)	M	300	7,83	-	-	2349	-	-	-	-
25 & 2405-1210-3928	Кабельний канал 40х16 (80) 220тм (3925)	M	300	12,93	-	-	3879	-	-	-	-
26 & 2405-1820-253	Стяжка 150х3 мм чорна	уп	2	16,14	-	-	32,28	-	-	-	-
27 & 2405-1792-15	Ізострічка електротехнічна 0,13мм х 15мм синя 10м	шт	4	14,77	-	-	59,08	-	-	-	-
28 & 2405-1792-42	Стрічка 2-х стор	рул.	2	14,97	-	-	29,94	-	-	-	-
29 & 2405-5008-60	Припій ПОС-60 100г на катушці	уп	2	179,53	-	-	359,06	-	-	-	-
30 & 2405-5004-15	Шуруп 3,5х16	уп	20	15,57	-	-	311,4	-	-	-	-
31 & 290220-3290-95	Шуруп 3,9х9,5	уп	20	19,12	-	-	382,4	-	-	-	-
32 & 2405-5004-13	Резистор 3 кОм	шт	100	0,77	-	-	77	-	-	-	-
33 & 2405-5004-MH	MH-1 кріплення	уп	20	49,17	-	-	983,4	-	-	-	-
34 & 2405-5004-452	Рідкі цвяхи	шт.	2	77,67	-	-	155,34	-	-	-	-
35 & 2405-5004-8P	Штекер RJ45 модель 8P8CS	шт	2	4,57	-	-	9,14	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							22062,04		-	-	-
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							22062,04		-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. Всього будівельні роботи, грн.					22062,04 22062,04				
		Всього по розділу 2					22062,04				
		Розділ 3. Монтажні роботи									
		Монтажні роботи									
36	M10-55-6	Кабель по стіні бетонній, маса 1 м до 3 кг	100 м	15	4743,17 4743,17	-	71147,55	71147,55	-	76,8000	1152
37	M10-667-2	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	3755,89 3755,01	0,88 0,15	3755,89	3755,01	0,88 0,15	60,8000 0,0026	60,8
38	M10-667-11	Пристрій проміжний на 10 променів	шт	3	1299,91 1299,20	0,71 0,12	3899,73	3897,6	2,13 0,36	22,4000 0,0021	67,2 0,01
39	M10-667-13	Пристрій проміжний на 1 промінь	шт	2	371,91 371,20	0,71 0,12	743,82	742,4	1,42 0,24	6,4000 0,0021	12,8
40	M10-668-4	Сповісвач ОС автомобільний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей	шт	10	92,80 92,80	-	928	928	-	1,6000	16
41	M10-669-5	Прилад оптико-електричний в одноканальному виконанні	шт	91	791,24 790,53	0,71 0,12	72002,84	71938,23	64,61 10,92	12,8000 0,0021	1164,8 0,19
42	M10-682-5	Пульт або табло, кількість сигналів до 30	шт	2	1466,75 1466,75	-	2933,5	2933,5	-	22,4000	44,8
43	M10-683-8	Пристрій перемикання живлення УЛГ	шт	4	1277,20 1257,22	-	5108,8	5028,88	-	19,2000	76,8
44	M10-683-10	Пульт керування виносний ВПК	шт	4	214,62 209,54	-	858,48	838,16	-	3,2000	12,8
45	M10-683-13	Сирена потужна до 1 Вт на кронштейні	шт	1	1489,01 1482,24	-	1489,01	1482,24	-	24,0000	24
46	M8-397-1	Профіль перфорований монтажний довжиною 2 м	100 м	6	921,02 921,02	-	5526,12	5526,12	-	14,4000	86,4
		Разом прямі витрати по розділу 3					168393,74	168217,69	69,04 11,67		2718,4 0,2
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					168393,74				
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн.					107,01 168229,36				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					52970,41 93,48 9483,79 221364,15				

		Всього по розділу 3					221364,15				
		Розділ 4. Пожежна сигналізація									
47 & 1602-30035-16M	Матеріали, необхідні для монтажу ПЛК17 Тірас 16П (метал)	шт	3	6946,30	-	20838,9	-	-	-	-	-
48 & 1602-30035-16П1	Прилад приймально-контрольний "Тірас 16.128-П1"	шт	1	9745,95	-	9745,95	-	-	-	-	-
49 & 1715-10060-14M	МЦА-GSM	шт	1	2138,07	-	2138,07	-	-	-	-	-
50 & 1602-30076-30	ПГК-3 комбінований пожежний сповіщувач	шт	77	260,09	-	20026,93	-	-	-	-	-
51 & 1504-18081-31ПР	SPR-1 сповіщувач пожежний ручний	шт	11	120,17	-	1321,87	-	-	-	-	-
52 & 1704-50724-12Г	Оповіщувач пожежний світлозвуковий "Гном-1"	шт	1	507,04	-	507,04	-	-	-	-	-
53 & 1704-50724-311	Світлове табло ОС-1 "ВИХІД"	шт	4	287,14	-	1148,56	-	-	-	-	-
54 & 1704-50724-315	Світлозвуковий сповіщувач "Пожар" ОС3-2	шт	4	377,64	-	1510,56	-	-	-	-	-
55 & 1704-50724-312B	Світлозвуковий сповіщувач "ВИХІД" ОС3-12	шт	4	377,64	-	1510,56	-	-	-	-	-
56 & 1511-3001-18	Акум. батарея LP 12- 18Ah типу AGM	шт	4	979,57	-	3918,28	-	-	-	-	-
	Разом прями витрати по розділу 4					62666,72	-	-	-	-	-
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. Всього будівельні роботи, грн.					62666,72					

	Всього по розділу 4						62666,72				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 5. Витратні матеріали, необхідні для монтажу											
57 & 15096-2011-291	Витратні матеріали, необхідні для монтажу JE-H(ST)H... BD... E30 01x2x0,8 OR	100м	2	1600,33	-	-	3200,66	-	-	-	-
58 & 15096-2011-55	Кабель вогнестійкий NHXH-J E90 3x1,5 RE OR	100м	0,3	3140,33	-	-	942,1	-	-	-	-
59 & 15096-2011-290-H	JE-H(ST)H... BD... E30 02x2x0,8 OR	м	200	17,63	-	-	3526	-	-	-	-
60 & 15096-2011-16H	Кабель КСВВнг-LS 8x0,4	м	1100	6,63	-	-	7293	-	-	-	-
61 & 1504-5289-90K	Коробка наружна 90_90	шт	4	55,64	-	-	222,56	-	-	-	-
62 & 2405-1210-2010	Кабельний канал 20x10 (140) 220гм (3925)	м.	300	7,83	-	-	2349	-	-	-	-
63 & 2405-1210-3928	Кабельний канал 40x16 (80) 220гм (3925)	м	100	12,93	-	-	1293	-	-	-	-
64 & 2405-1820-253	Стяжка 150x3 мм чорна	уп	10	16,14	-	-	161,4	-	-	-	-
65 & 2405-1792-15	Ізострічка електротехнічна 0,13мм x 15мм синя 10м	шт	2	14,77	-	-	29,54	-	-	-	-
66 & 2405-5008-60	Приліп ПОС-60 100г на катушці	уп	1	179,53	-	-	179,53	-	-	-	-
67 & 2405-5004-MH	MH-1 кріплення	уп	10	49,17	-	-	491,7	-	-	-	-
варіант 1	Разом прямі витрати по розділу 5						19688,49		-		-
	Разом будівельні роботи, грн.						19688,49				
	в тому числі:										
	вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.						19688,49				
	Всього будівельні роботи, грн.						19688,49				
	Всього по розділу 5						19688,49				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 6. Монтажні роботи											
68 М10-55-6	Монтажні роботи		100 м	15,3	<u>4743,17</u>	-	72570,5	72570,5	-	<u>76,8000</u>	<u>1175,04</u>
69 М10-349-6	Кабель по стіні бетонний, маса 1 м до 3 кг		шт	12	<u>4743,17</u>	-	6939,6	6939,6	-	<u>9,6000</u>	<u>115,2</u>
70 М10-667-2	Монтаж табло сигнального студійного або коридорного		шт	4	<u>578,30</u>	-	15023,56	15020,04	-	<u>60,8000</u>	<u>243,2</u>
71 М10-668-1	Блок базовий на 20 промінь приймально-контрольного пускового конденсатора ПС		шт	10	<u>3755,89</u>	<u>0,88</u>	0,15	962,3	928	<u>3,52</u>	<u>60,8000</u>
72 М10-668-3	Сповісвач ПС автоматичний тепловий, електроконтактний, магілконтактний у нормальному виконанні		шт	70	<u>92,80</u>	<u>0,15</u>	13063,4	12992	<u>0,6</u>	<u>0,0026</u>	<u>0,01</u>
73 М10-683-13	Сповісвач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у вибухозахисному виконанні		шт	1	<u>186,62</u>	<u>1,02</u>	1489,01	1482,24	<u>71,4</u>	<u>1,6000</u>	<u>24</u>
74 М10-698-1	Сирена потужна до 1 кВт на кронштейні		шт	4	<u>185,60</u>	<u>0,17</u>	187,28	185,6	<u>11,9</u>	<u>0,0101</u>	<u>0,21</u>
75 М8-397-1	Коробка відгалужувальна на стіні		шт	4	<u>46,82</u>	-	3684,08	3684,08	-	<u>3,2000</u>	<u>57,6</u>
76 П1-77-1	Профіль перфорований монтажний довжиною 2 м		Комплекс	1	<u>921,02</u>	-	7468,95	7468,95	-	<u>14,4000</u>	<u>85</u>
77 П1-58-1	Пусконаладжувальні роботи (Охоронно-тривожна сигналізація)		Сигнал	64	<u>175,74</u>	-	11247,36	11247,36	-	<u>2,0000</u>	<u>128</u>
78 П1-77-1	Системи централізованого [диспетчерського] управління ділянками, що входять у загальний технологічний комплекс. Технологічний комплекс, що включає в себе керувані ділянки, у кількості до 5 шт		Комплекс	1	<u>175,74</u>	-	7468,95	7468,95	-	<u>85,0000</u>	<u>85</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79 П1-58-1	Схеми сигналізації. Схеми збору і реалізації сигналів інформації пристроїв захисту, автоматики електричних і технологічних режимів	Сигнал	64	175,74 175,74	-	-	11247,36	11247,36	-	2,0000	128
80 П1-51-1	Елементи систем автоматичного управління і регулювання. Датчик контактний механічний з числом кіл управління до 2	шт	70	175,74 175,74	-	-	12301,8	12301,8	-	2,0000	140
	Разом прямі витрати по розділу 6						163654,15	163536,48	109,22 18,4		2424,24 0,32
	Разом будівельні роботи, грн.						163654,15				
	в тому числі:										
	вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.						8,45				
	всього заробітна плата, грн.						163554,88				
	Загальноновиробничі витрати, грн.						50568,75				
	трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.						85,51				
	заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.						8679,26				
	Всього будівельні роботи, грн.						214222,9				
	Всього по розділу 6						214222,9				
	Разом прямі витрати по кошторису						509770,26	331754,17	178,26 30,07		5142,64 0,52
	Разом будівельні роботи, грн.						509770,26				
	в тому числі:										
	вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.						177837,83				
	всього заробітна плата, грн.						331784,24				
	Загальноновиробничі витрати, грн.						103539,16				
	трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.						178,99				
	заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.						18163,05				
	Всього будівельні роботи, грн.						613309,42				
	Всього по кошторису						613309,42				
	Кошторисна трудомісткість, люд.год.						5322,15				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					349947,29				

Склад


інженер-проектувальник
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Воевідко В.В.

Перевірів

директор
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Рудницький О.С.



Капітальний ремонт складських приміщень №11-16 Центрального Мікрорегіонального управління державної міграційної служби у м.Києві та Київській області за адресою: вулиця Молодогвардійська, 28, літ Е, м. Київ.

2021 закрито актами №№1-11+

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-9

на Капітальний ремонт складських приміщень №11-16 АКТ №9 за адресою: вулиця Молодогвардійська, 28, літ Е, м. Київ.

Капітальний ремонт складських приміщень №11-16 Центрального Мікрорегіонального управління державної міграційної служби у м.Києві та Київській області за адресою: вулиця Молодогвардійська, 28, літ Е, м. Київ.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 640,10172 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,99574 тис.люд.-год.
Кошторисна заробітна плата 189,52538 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений в поточних цінах станом на "11 травня" 2021 р.

№ п/п	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. ПОКРІВЛЯ ТА НАВІСИ											
1	РН8-2-4	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	100м2	1,1917	2457,40 2399,16	58,24 53,49	2928,48	2859,08	69,4 63,74	45,4300 0,8772	54,14 1,05
2	РН8-1-2	Розбирання лат [решетування] з дошок з прозорами	100м2	1,1917	1513,65 1482,50	31,15 28,61	1803,82	1766,7	37,12 34,09	26,7600 0,4692	31,89 0,56
3	РН8-26-2	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дошок і брусків під покрівлю з листової сталі	100м2	1,1917	11632,02 1746,51	34,54 31,72	13861,88	2081,32	41,16 37,8	30,9500 0,5202	36,88 0,62
4	РН20-20-3	Антисептування пастами перекриттів, прогонів, балок, накатів	100м2	1,9117	4248,24 679,89	-	8121,36	1299,75	-	10,8800	20,8
5	ЕН10-36-1 К=1,15	Установлення каркаса з брусів	м3	1,1917	14777,42 4691,98	38,63 13,07	17610,25	5591,43	46,04 15,58	70,5985 0,1553	84,13 0,19
6	РН8-36-3	Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар	100м2	1,1917	2913,24 797,94	8,80 8,09	3471,71	950,91	10,49 9,64	12,9200 0,1326	15,4 0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7 Е9-42-1 к=1,15	Улаштування покриття з листа профільованого	100м2	1,1917	3839,02	361,66	4574,96	4136,51	430,99	58,3280	69,51	
8 & С111-140-5	Саморез покрівельний 4,8х28 мм	шт.	953,36	3471,10	141,22	1763,72	-	168,29	2,1566	2,57	
9 & С111-1235-1	Листи металевого профілю RAL	м2	131,087	256,24	-	33589,73	-	-	-	-	
10 РН8-40-4 варіант 1	Улаштування з листової сталі плоскє, сандрикіє, підвєконних відлигєє	100м	0,7	8926,61	6,09	6248,63	1719,19	4,26	41,2700	28,89	
11 & С111-140-5	Саморез покрівельний 4,8х28 мм	шт.	280	2455,98	5,60	518	-	3,92	0,0918	0,06	
варіант 2	Разом прямі витрати по розділу 1						94492,54	20404,89	639,46	341,64	
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборнічі витрати, грн. трудоємність в загальновиборнічих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборнічих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.						94492,54	333,06		5,21	
	Всього по розділу 1						101772,74				
12 РН20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	3,00308	86,08	-	258,51	258,51	-	1,6300	4,9	
13 С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	3,00308	184,51	184,51	554,1	-	554,1	-	-	
14 РН12-65-14	СТЕЛЯ Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	1,4791	1969,81	-	2913,55	2913,55	-	37,3000	55,17	
15 Е9-37-1	Монтаж каркасів підвєсної стелі із підвєсками і деталями кріплень	т	1,6431	66782,16	1406,97	109729,77	11655,33	2311,79	105,1200	172,72	
16 Е9-38-1	Монтаж стель підвєсних комбїнованих сталєних з облицюванням алюмінієвими листами	100м2	5,477	7093,50	147,37	367633,05	135303,81	242,14	2,2374	3,68	
				67123,07	1194,68			6543,26	400,0000	2190,8	
				24704,00	449,50			2461,91	6,8905	37,74	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	РН11-59-3	Безпіддане накриття стін	100м2	1,4791	4542,83	-	6719,3	4857,1	-	50,1500	74,18
		Разом прямі витрати по розділу 2			3283,82	-	487808,28	154988,3	9409,15	-	2497,77
		Разом будівельні роботи, грн.					487808,28		2793,42		42,65
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					323410,83				
		всього заробітна плата, грн.					157781,72				
		Загальновиборничі витрати, грн.					50520,7				
		трудоємність в загальновиборничих витратах, люд. год.					92,25				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					9360,93				
		Всього будівельні роботи, грн.					538328,98				

		Всього по розділу 2					538328,98				
		Разом прямі витрати по кошторису					582300,82	175393,19	10048,61		2839,41
		Разом будівельні роботи, грн.					582300,82		3126,48		47,86
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					396859,02				
		всього заробітна плата, грн.					178519,67				
		Загальновиборничі витрати, грн.					57800,9				
		трудоємність в загальновиборничих витратах, люд. год.					108,47				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					11005,71				
		Всього будівельні роботи, грн.					640101,72				

		Всього по кошторису					640101,72				
		Кошторисна трудоємність, люд. год.					2995,74				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					189525,38				

Склав

інженер-проектувальник

Воевідко В.В.


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

директор

Рудницький О.С.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт складських приміщень №11-16 Центрального Міжрегіонального управління державної міграційної служби у м.Києві та Київській області за адресою: вулиця Молодогвардійська, 28, літ Е, м. Київ.

2021 закрито актами №№1-11+

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-10

на Капітальний ремонт складських приміщень №11-16 АКТ №10 за адресою: вулиця Молодогвардійська, 28, літ Е, м. Київ.

Капітальний ремонт складських приміщень №11-16 Центрального Міжрегіонального управління державної міграційної служби у м.Києві та Київській області за адресою: вулиця Молодогвардійська, 28, літ Е, м. Київ.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 414,1416 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,04778 тис.люд.-год.
Кошторисна заробітна плата 132,70671 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений в поточних цінах станом на "11 травня" 2021 р.

№ п/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Всього		Заробітна		Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Е9-37-1	СТЕПЛЯ Монтаж каркасів підвісної стелі із підвісками і деталями кріплення	т	1,2879	66977,52	1057,20	86260,35	9135,72	1361,57	105,1200	135,38	
2	Е9-38-1	Монтаж стель підвісних комбінованих сталевих з облицюванням алюмінієвими листами	100м2	4,293	7093,50	53,46	287995,13	106054,27	68,85	0,8224	1,06	
					67084,82	7045,10			30244,61	400,0000	1717,2	
					24704,00	2369,62			10172,78	28,5202	122,44	
		Разом прями витрати по кошторису			374255,48	115189,99			31606,18		1852,58	
		Разом будівельні роботи, грн.			374255,48				10241,63		123,5	
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.			227459,31							
		всього заробітна плата, грн.			125431,62							
		Загальновиборобничі витрати, грн.			39886,12							
		трудомісткість в загальновиборобничих витратах, люд.год.			71,7							
		заробітна плата в загальновиборобничих витратах, грн.			7275,09							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					414141,6				

		Всього по кошторису					414141,6				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2047,78				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					132706,71				

Сілав

інженер-проектувальник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]


Возвідко В.В.

Перевіряв

директор

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Рудницький О.С.

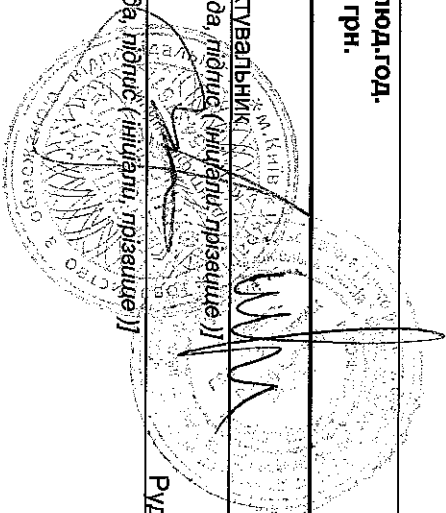

Капітальний ремонт складських приміщень №11-16 Центрального Міжрегіонального управління державної міграційної служби у м.Києві та Київській області за адресою: вулиця Молодогвардійська, 28, літ Е, м. Київ.

2021 закрито актами №№1-11+

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-11

на Капітальний ремонт складських приміщень №11-16 АКТ №11 за адресою: вулиця Молодогвардійська, 28, літ Е, м. Київ.

Капітальний ремонт складських приміщень №11-16 Центрального Міжрегіонального управління державної міграційної служби у м.Києві та Київській області за адресою: вулиця Молодогвардійська, 28, літ Е, м. Київ.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1166,22699 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,84618 тис.люд.-год.
Кошторисна заробітна плата 228,62738 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,9 розряд

Складений в поточних цінах станом на "11 травня" 2021 р.

№ п/п	Об'єкту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд.-год.		
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
											заробіт- ної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ											
1	РН5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	9,675	445,72 425,65	20,07 7,91	4312,34	4118,16	194,18 76,53	8,0600 0,1107	77,98 1,07
2	РН6-15-1	Знімання напичників	100 м	0,153	358,04 358,04	- -	54,78	54,78	- -	6,6500	1,02
3	РН6-13-1	Демонтаж деревних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,12	10223,99 10214,10	- -	1226,88	1225,69	- -	184,3700	22,12
4	РН6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,3759	2405,57 2405,57	- -	904,25	904,25	- -	44,6800	16,8
5	РН20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж)Монтаж дрібних металоконострукцій решітки ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ СТІНИ	1т	0,336	4245,62 3190,54	1055,08 217,01	1426,53	1072,02	354,51 72,92	43,4679 2,6055	14,61 0,88
6	РН11-50-1	Відбивання штукатурки зі стін	100м2	8,605	3454,58 3218,24	236,34 93,14	29726,66	27692,96	2033,7 801,47	60,9400 1,3038	524,39 11,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7 ЕІ3-13-5 К=1,15	грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь, перший шар		100м2	9,805	595,49	47,41	5838,78	5372,94	464,86	7,6705	75,21
8 С111-233-1 варіант 1	Грунтовка гідроізоляційна Пенетрон		кг	784,4	547,98	4,32	104285,98	-	42,36	0,0668	0,66
9 ЕІ3-13-6	грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь, наступний шар		100м2	9,805	517,82	41,23	5077,23	4672,08	404,26	6,6700	65,4
10 С111-233-1 варіант 1	Грунтовка гідроізоляційна Пенетрон		кг	196,1	132,95	3,76	26071,5	-	36,87	0,0581	0,57
11 РН7-16-3	ВІАШТУВАННЯ ПІДЛОГИ Улаштування підстильного шару щебеневого		м3	112,6	1585,14	229,42	178486,76	35919,4	25832,69	5,5000	619,3
12 РН7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного		м3	112,6	2496,14	89,01	281065,36	41927,74	10022,53	1,3915	156,68
13 С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм		т	9,99888	26686,32	-	266833,31	-	-	-	-
14 С111-2017-5 варіант 2	Добавка для підвищення водонепроникності бетонів і розчинів (суха) Пенетрон Адмикс 2, 5кг/м.куб		кг	287,13	153,32	-	44022,77	-	-	-	-
15 РН7-2-8	УЛАШТУВАННЯ ПІДЛОГИ ПІД РАМПОЮ Розбирання цементних покриттів підлог		100м2	1,302	4430,45	889,20	5768,45	4610,71	1157,74	61,0560	79,49
16 РН1-2-1	Розробка ґрунту при підведенні, заміні або посиленні фундаментів внутрішніх стін в котловані глибиною до 1,5 м		100 м3	1,302	51972,57	-	67668,29	61062,17	441,95	5,2783	6,87
17 РН7-16-3	Улаштування підстильного шару щебеневого		м3	13,02	1694,82	275,30	22066,56	4984,06	3584,41	6,6000	85,93
18 РН7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного		м3	13,02	2920,89	106,81	38029,99	4848,13	1390,67	1,6698	21,74
19 С111-2017-5 варіант 1	Добавка для підвищення водонепроникності бетонів і розчинів (суха) Пенетрон Адмикс		кг	39,8412	372,36	-	7733,97	-	-	-	-
20 РН20-40-1	Навантаження сміття вручну		1 т	6,01524	86,08	-	517,79	517,79	-	1,6300	9,8
21 С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км		т	6,01524	184,51	29,76	1109,87	-	1109,87	-	-
	Разом прямі витрати по кошторису						1092228,05	198982,88	35136,22	0,4110	2,47
	Разом будівельні роботи, грн.						1092228,05		13064,31		3480,62
	в тому числі:										
	вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.						858108,95				
	всього заробітна плата, грн.						212047,19				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальноновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					73998,94 163,4 16580,19 1166226,99				
		Всього по кошторису					1166226,99				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					3846,18 228627,38				

Склав

Б.В. Воевідю

Перевіряв

О.С. Рудницький

