

Підприємство, організація - ТОВ "УКРТЕХЗАХИСТ"

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - 42263686

Замовник - 3 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Тернопільській області

Генпідрядник - ТОВ "УКРТЕХЗАХИСТ"

Субпідрядник -

Договір № 266 від 11 грудня 2023 року

Найменування об'єкта: Монтаж системи пожежної сигналізації, системи оповіщення людей про пожежу та керування евакуюванням у приміщеннях 4 ДПРЧ 3 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Тернопільській області, м. Збараж, вул. Романа Гралока, 4. ДК 45310000-3 "Електромонтанжні роботи"

Підстава: Договірна ціна

А К Т № 1
приймання виконаних робіт (послуг)
за грудень 2023 року

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Обґрунтування (шифр і № позиції нормативу)	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна одиниці виміру, грн.				Виконано робіт (витрати), грн.	Витрати труда робітників, що обслуговують машини, на обсяг робіт, люд.год.
					у тому числі		у тому числі			
					Заробітна плата	Експлуатація машин та механізмів	у тому числі за робіт- ною платою машиністів			
							7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

11 грудня 2023 року

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Об'єкт 2-1 Монтаж системи пожежної сигналізації, системи оповіщення людей про пожежу та керування евакуюванням у приміщеннях 4 ДПРЧ 3 ДПРЗ, м. Збараж, вул. Романа Гралоюка, 4. ДК 45310000-3 "Електромонтажні роботи"								
	<u>Локальний кошторис</u> <u>02-01-01</u> <u>на Система пожежної автоматики</u> <u>Розділ . Система пожежної автоматики</u>								
1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного сигнального концентратора ПС	КМ10-667-6	шт	1	1394,84	1393,15	1,69	1395	25,6
2	Прилад контрольно-приймальний Тірас-8П	1602-30012-1 варіант 25 КМ8-121-1	шт	1	6860,00	-	0,24	6860	-
3	Монтаж акумуляторної батареї		шт	1	189,25	189,25	-	189	3,2
4	Акумулятор 12В 7А	1511-2001-1 варіант 5 КМ10-386-7	шт	1	840,00	-	-	840	-
5	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні		шт	1	178,53	178,53	-	179	3,2
6	Оповіщувач світло-звуковий ОСЗВ "Джміль-1"	1602-30087-2 варіант 5 КМ10-349-6	шт	1	960,00	-	-	960	-
7	Монтаж табло сигнального студійного або коридорного		шт	5	522,43	522,43	-	2612	48
8	Оповіщувач світло-звуковий ОСЗ-12 "Вихід"	1602-30087-1 варіант 17 КМ10-668-1	шт	5	920,00	-	-	4600	-
9	Словіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні		шт	11	87,16	83,82	3,34 0,53	959	17,6 0,11
10	Словіщувач пожежний тепловий ТПТ-3		шт	11	98,00	-	-	1078	-
11	Словіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізоглотний, світловий у нормальному виконанні	1602-30063-1 КМ10-668-2	шт	19	168,51	167,65	0,86 0,14	3202	60,8 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	Словішувач пожежний димовий СПД-3	1602-30063-1 варіант 1 КМ10-668-1	шт	19	218,00	-	-	4142	-
13	Словішувач ПС автоматичний ручний електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні		шт	4	87,16	83,82	3,34 0,53	349	6,4 0,04
14	Словішувач пожежний ручний СПР-1	1602-30068-1 варіант 1	шт	4	178,00	-	-	712	-
15	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 25 см	КБ46-29-3	100шт	0,22	4263,10	4263,10	-	938	16,61
16	Прокладання коробів пластикових	КБ21-12-2	100м	0,82	1857,90	1851,56	-	1523	26,9
17	Кабельний канал 20*10	С118-37 варіант 12	м	20	18,50	-	-	370	-
18	Кабельний канал 25*16	С118-37 варіант 13	м	60	20,60	-	-	1236	-
19	Кабельний канал 40*25	С118-37 варіант 11	м	2	40,80	-	-	82	-
20	Прокладання ізолязованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	КБ21-13-1	100м	3,03	361,64	361,64	-	1096	18,97
21	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	КМ10-671-2	100 м	1	2534,43	2499,39	35,04 4,79	2534	44,8 0,09
22	Провід сигналізаційний СКВВНГ 6*0,4	15096-1011-1 варіант 34	м	250	7,20	-	-	1800	-
23	Кабель вогнестійкий JY-(St)Y 1x2x0,8	15096-1011-1 варіант 32	м	150	13,80	-	-	2070	-
24	Кабель вогнестійкий (N)HХН FEK 180/E30 3*1, 5	15096-1011-1 варіант 35	м	3	80,00	-	-	240	-
25	Пуско-налагоджувальні роботи Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів до 2 Разом по розділу Система пожежної автоматики Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн. Всього по об'єкту прями витрати, грн.	КП2-16-2	Система	1	873,07	873,07	-	873	11
								40839	283,08 0,29
								40839	283,08 0,29
								40839	283,08 0,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Разом прямі витрати		грн.					40839,00	<u>283,08</u> 0,29
	у тому числі:								
	- вартість матеріалів, виробів та комплектів		грн.					24995,00	
	- заробітна плата		грн.					15739,00	
	- вартість експлуатації машин		грн.					105,00	
	у тому числі:								
	- заробітна плата робітників, що		грн.					16,00	
	обслуговують машини								
II.	Загальноновиробничі витрати	Розрахунок	грн.					3466,00	<u>-</u> 0,29
III.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд		грн.					-	-
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період							-	-
	Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)		грн.					44305,00	<u>283,08</u> 0,29
V.	у тому числі: зворотні суми		грн.					-	-
	Інші супутні витрати							-	-
	Разом (I+II+III+IV+V)		грн.					44305,00	<u>283,08</u> 0,29
VI.	Прибуток	Настанова [4.38]	грн.					2106,00	
VII.	Адміністративні витрати	Настанова [4.39]	грн.					1095,00	
VIII.	Кошти на покриття ризиків		грн.					-	
IX.	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами		грн.					-	
	Всього вартість будівельних робіт		грн.					46411,00	
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		грн.					47506,00	<u>283,08</u> 0,29
X.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва - без врахування таких, що обчислюються від обсягу реалізації продукції							-	
	1. Разом		грн.					47506,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Вартість матеріалів поставки замовника та витрат замовника з експлуатації машин і механізмів		грн.						
	3. Зворотні суми		грн.						
	4. База для визначення обсягу реалізації продукції, виконаного власними силами (п4.зп.1-п.2-п.3)		грн.					47506,00	
	- Єдиний податок за ставкою 5%	Розрахунок N П-137	грн.					2500,00	
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)		грн.					50006,00	283,08
	Всього за актом		грн.					50006,00	283,08
									0,29
									283,08
									0,29

Примітка :

- "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин.
Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 15755 грн.,
у тому числі:

- зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 15739 грн.,
- зарплата в експлуатації машин: 16 грн.;
- зарплата у складі загальноновиробничих витрат: 0 грн.


М. П. Замовник:

М. П. Інженер:

М. П. Генпідрядник (підрядник):

М. П. Субпідрядник:

Нерівник
Нерівник

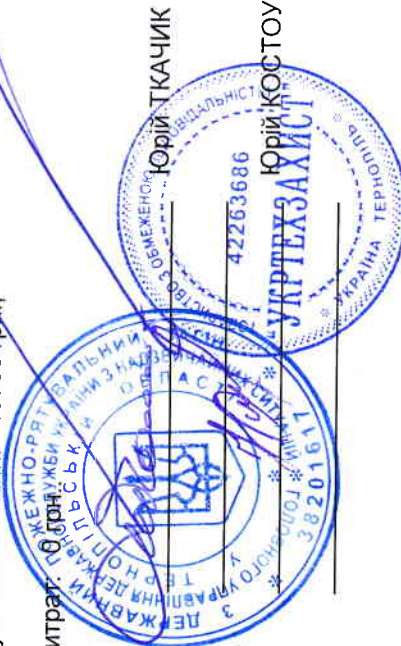

Юрій ТКАЧИК

" 11 " 12 2023 року

" " " 20 року

" 11 " 12 2023 року

" " " 20 року
